

BUSINESS PLAN • DOSSIER DE FINANCEMENT

Société de transport minier

Flotte de 100 camions-bennes lourds — République de Guinée

Corridor bauxitique Boké-Boffa · Contrat de transport au tonnage · Financement structuré sans recours limité

100
camions-bennes
lourds

3,9 Mt/an
capacité stabilisée

32,6 M USD
coût total du projet

29,7 %
TRI fonds propres

1,60x
DSCR minimum

Élément	Information
Promoteur (sponsor)	ALPHA B HANOK SARL — Construction (BTP), consultation, négoce, commerce général
Emprunteur	Société de projet dédiée (SPV) de droit guinéen, régie par l'Acte uniforme OHADA
Financement recherché	Dettes senior 21,2 M USD (65 %) — fonds propres 11,4 M USD (35 %)
Version	Version 3.0 consolidée — harmonisation des versions 1 et 2 et révision du modèle financier
Date	Septembre 2026
Classification	Strictement confidentiel — diffusion restreinte aux investisseurs et prêteurs sollicités

FICHE SYNTHÉTIQUE DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT

Cette fiche résume, au format d'une **term sheet indicative**, les paramètres de financement soumis aux prêteurs et investisseurs. Elle ne constitue pas une offre ; les conditions définitives résulteront de la due diligence et de la négociation avec les établissements financiers.

Paramètre	Proposition indicative
Emprunteur	SPV de droit guinéen dédiée exclusivement au projet (société anonyme OHADA), détenue majoritairement par des personnes guinéennes (loi sur le contenu local)
Sponsor	ALPHA B HANOK SARL, avec ouverture possible à un partenaire technique ou financier minoritaire
Objet	Acquisition et mise en exploitation de 100 camions-bennes lourds, d'une flotte de soutien et d'un atelier central pour le transport de bauxite sous contrat pluriannuel
Coût total du projet	32,6 M USD, dont investissements 27,0 M USD, fonds de roulement 3,0 M USD, frais et intérêts intercalaires 1,39 M USD, dotation initiale DSRA 1,20 M USD
Instrument	Prêt senior à terme amortissable ou crédit-bail équivalent, 21,2 M USD, en USD
Durée	7 ans à compter du premier tirage, dont 12 mois de période de mobilisation (différé en capital)
Taux indicatif	10,5 % fixe (ou équivalent SOFR + marge), commission de montage 2,0 %, commission d'engagement sur non-tiré
Remboursement	Semestriel, profil sculpté sur un DSCR cible constant de 1,60x ; extinction à la fin de l'année 6 d'exploitation
Fonds propres	11,4 M USD (35 %), apportés avant le premier tirage (capital et avances d'actionnaires subordonnées)
Sûretés	Nantissement de la flotte et des équipements, cession des créances du contrat minier, nantissement des comptes et des titres de la SPV, délégation des polices d'assurance
Comptes de réserve	DSRA de 6 mois de service de la dette ; compte de réserve de maintenance (MRA) pour les révisions majeures
Engagements financiers	DSCR historique $\geq 1,30x$ (blocage des distributions $< 1,20x$; défaut $< 1,10x$) ; LLCR $\geq 1,40x$; ratio dette / (dette + fonds propres) ≤ 70 %
Conditions préalables clés	Contrat de transport signé (≥ 5 ans, take-or-pay, indexation carburant), audit de corridor, offres fermes constructeurs, avis fiscal, ESIA/ESMS, apport intégral des fonds propres

29,7 % TRI fonds propres	19,9 % TRI projet après impôt	6,10 M\$ VAN fonds propres à 18 %	1,60x DSCR min. / LLCR 1,60x	4,0 ans retour des fonds propres
------------------------------------	---	---	--	--

AVERTISSEMENT ET PÉRIMÈTRE DU DOCUMENT

NATURE DU DOCUMENT

Ce business plan est un dossier de décision et de recherche de financement. Il ne constitue ni une offre ferme d'un constructeur, ni un engagement bancaire, ni un avis juridique ou fiscal. Les statistiques sectorielles et les textes cités proviennent de sources publiques identifiées (section 17). Les prix des camions, le tarif de transport, les coûts unitaires, la productivité, les conditions de financement et les projections sont des **hypothèses de modélisation** à confirmer par des devis, une étude de route, un contrat minier et une due diligence indépendante.

Catégorie	Traitement dans ce document
Données publiques vérifiées	Production et exportations minières, principaux opérateurs, poids du secteur, taux de change, cadre fiscal de référence et contenu local
Hypothèses techniques	Charge utile, distance, rotations, disponibilité mécanique, consommation, jours d'exploitation
Hypothèses commerciales	Tarif par tonne, volume minimum garanti, indexation, durée du contrat et délai de paiement
Hypothèses financières	CAPEX, OPEX, conditions de la dette, amortissements, valeur résiduelle, fonds de roulement et comptes de réserve

Normes de présentation. Les projections sont établies en dollars américains (USD), en millions sauf mention contraire, en termes nominaux. Les états financiers prévisionnels suivent les principes des normes IFRS (IAS 16 pour les immobilisations, IAS 23 pour la capitalisation des intérêts intercalaires) ; les comptes statutaires de la SPV seront tenus selon le SYSCOHADA révisé. Les ratios de crédit (DSCR, LLCR, ratio d'endettement) sont calculés selon les conventions usuelles du financement de projet.

CONDITION DE DÉCISION

La commande des 100 camions ne doit être lancée qu'après signature d'un contrat ferme, vérification du corridor, réception d'offres fournisseurs comparables, confirmation écrite du régime fiscal et douanier, et bouclage du financement.

SOMMAIRE

N°	Section	N°	Section
01	Résumé exécutif	02	Présentation du projet et du promoteur
03	Analyse du marché minier guinéen	04	Stratégie commerciale et contractuelle
05	Plan technique et opérationnel	06	Organisation, ressources humaines et contenu local
07	HSE, normes environnementales et sociales	08	Cadre juridique, fiscal et institutionnel
09	Coût du projet et plan de financement	10	Hypothèses et prévisions financières
11	Analyse de sensibilité et tests de résistance	12	Analyse du risque de crédit
13	Gouvernance, conformité et reporting	14	Plan de mise en œuvre
15	Risques stratégiques et mesures de maîtrise	16	Conclusion et recommandation d'investissement
17	Sources documentaires		

Annexe	Contenu
A	Matrice complète des hypothèses
B	Plan de due diligence avant financement
C	États financiers prévisionnels détaillés
D	Cahier des charges minimal des camions
E	Note de révision : harmonisation des versions 1 et 2
F	Glossaire financier

01 RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le projet consiste à créer un **opérateur guinéen de transport minier intégré**, doté de 100 camions-bennes lourds, d'un atelier central, d'une flotte d'assistance, d'un système numérique de gestion de flotte et d'une organisation fonctionnant en continu. Le marché prioritaire est le transport de bauxite sur les corridors de Boké et de Boffa, entre sites miniers, stocks, installations de traitement et terminaux portuaires.

Le marché est profond : en 2025, la Guinée a produit **175,45 millions de tonnes** de bauxite et en a exporté **182,83 millions**, en hausse respective de 24 % et 25 % sur 2024. À capacité stabilisée (3,90 Mt/an), la flotte proposée représente environ **2,1 % des exportations nationales**, un objectif significatif mais compatible avec la taille du marché.

Source : Ministère des Mines et de la Géologie / ITIE-Guinée, Bulletin des Statistiques Minières et Carrières n°30, avril 2026.

3,90 Mt/an volume stabilisé	7,10 USD/t tarif initial modélisé	25,7 M\$ chiffre d'affaires A2	10,2 M\$ EBITDA A2 (40 %)
29,7 % TRI fonds propres	6,10 M\$ VAN à 18 %	1,60x DSCR minimum	4,0 ans retour des fonds propres

Demande de financement

Le coût total du projet s'élève à **32,6 M USD**, financé à 65 % par une dette senior de **21,2 M USD** sur 7 ans et à 35 % par des fonds propres de **11,4 M USD**. Le service de la dette est couvert en moyenne 1,60x sur la durée du prêt dans le cas de base, au-dessus du seuil de 1,30x usuellement exigé par les prêteurs pour un actif de ce profil.

THÈSE D'INVESTISSEMENT

Le projet est **bancable sous quatre protections contractuelles** : volume minimum garanti (take-or-pay), indexation du carburant, responsabilité du client sur l'état de la route et mécanisme de paiement sécurisé (cession de créances et compte séquestre). La valeur ne réside pas dans la flotte elle-même, mais dans le **droit contractuel de transporter un volume rentable pendant une durée au moins égale à celle de la dette**.

Critère de décision	Seuil recommandé	Cas de base
Durée ferme du contrat	≥ 7 ans (durée de la dette) ; 5 ans minimum avec clause de reprise de dette	7 ans modélisés
Volume annuel garanti (take-or-pay)	≥ 3,38 Mt/an en régime (DSCR 1,30x)	3,55 Mt en A2 puis 3,90 Mt
Tarif contractuel plancher	≥ 6,55 USD/t en A1, indexé (DSCR 1,30x)	7,10 USD/t en A1, indexé 2 %/an
Indexation carburant	Mensuelle, ou carburant fourni par le client	Clause obligatoire
Délai de paiement	30 jours maximum, compte séquestre	30 jours modélisés

Critère de décision	Seuil recommandé	Cas de base
Apport des promoteurs	≥ 35 % du coût total, avant tout tirage	11,4 M USD

02 PRÉSENTATION DU PROJET ET DU PROMOTEUR

2.1 Objet et proposition de valeur

La société fournira un **service de transport minier facturé à la tonne**, incluant les véhicules, les chauffeurs, le carburant, la maintenance, les pneumatiques, la supervision, le suivi GPS, la sécurité, l'assurance et le reporting. Le client minier conserve la responsabilité du chargement, du déchargement, de la disponibilité de la route et des autorisations d'accès au site, sauf stipulation contraire.

2.2 Périmètre des services

Service	Description	Facturation
Transport principal de bauxite	Mine vers stock, concasseur, port ou point de transfert	USD par tonne validée
Transport interne de site	Mouvements entre fosse, ROM pad, concasseur et stock	USD par heure ou par tonne
Transport de matériaux	Latérite, stériles, agrégats, matériaux de route	USD par tonne-kilomètre
Mise à disposition de flotte	Camions avec chauffeurs et maintenance	USD par camion-jour
Prestations complémentaires	Dépannage, gestion de flotte, reporting, formation à la conduite	Forfait ou coût remboursable

2.3 Positionnement

Le positionnement retenu est celui d'un **opérateur local structuré selon les standards miniers internationaux** : forte disponibilité mécanique, contrôle des consommations, prévention de la fatigue, traçabilité des tonnages, discipline de maintenance et production continue. Ce positionnement est plus défendable qu'une simple location de camions, car il permet de vendre une performance mesurable et contractualisée.

2.4 Implantation

Le corridor Boké-Boffa est la zone prioritaire, en raison de la concentration des opérateurs bauxitiques et des infrastructures portuaires. La localisation définitive du dépôt sera arrêtée après analyse multicritère : distance au client, accès au carburant, disponibilité foncière, sécurité, drainage, proximité des pièces et acceptabilité communautaire.

CHOIX DE MARCHÉ

Le transport du minerai de fer de Simandou repose sur l'infrastructure ferroviaire transguinéenne. Le projet vise donc en priorité la bauxite, les mouvements internes de mine, les matériaux de construction et les services de soutien, plutôt qu'un transport routier longue distance du minerai de fer.

2.5 Promoteur et capacité de mise en œuvre

Le projet est porté par **ALPHA B HANOK SARL**, société guinéenne active dans la construction (BTP), la consultation, le négoce et le commerce général. Ce positionnement

apporte une connaissance du tissu économique local, des chantiers et des circuits d'approvisionnement.

Les prêteurs internationaux évaluent en priorité **l'expérience opérationnelle du sponsor dans le transport minier**. Pour sécuriser ce point, le plan retient les mesures suivantes :

- recrutement d'un directeur général et d'un directeur technique justifiant chacun d'au moins 10 ans d'expérience en gestion de flottes minières ;
- contrat de maintenance et d'assistance technique avec le constructeur (OEM) pendant les 24 premiers mois, avec techniciens résidents ;
- ouverture possible du capital à un partenaire technique minoritaire disposant de références en Afrique de l'Ouest ;
- constitution d'un dossier sponsor complet : statuts, états financiers certifiés des 3 derniers exercices, références de chantiers, identification des bénéficiaires effectifs (KYC).

03 ANALYSE DU MARCHÉ MINIER GUINÉEN

3.1 Poids économique et dynamique sectorielle

Le secteur extractif est central dans l'économie guinéenne. Selon l'ITIE, il représentait 20 % du PIB, 92 % des exportations et plus de 17 % des recettes publiques en 2022 ; pour 2023, l'ITIE indique 93 % des exportations et 22 % des recettes publiques. Cette concentration crée un marché de services important, mais expose les sous-traitants aux cycles miniers, aux décisions réglementaires et à la dépendance envers quelques grands donneurs d'ordre.

Source : Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives, fiche pays Guinée et décision de validation 2026.

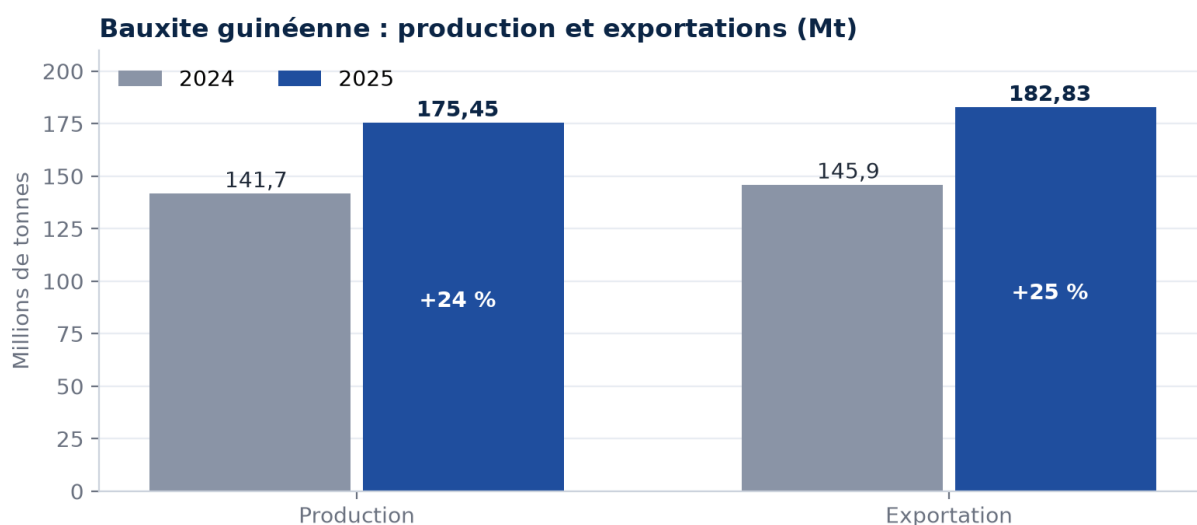


Figure 1 — Production et exportations de bauxite, 2024-2025

Source : MMG / ITIE-Guinée, Bulletin n°30.

3.2 Structure concurrentielle et clients cibles

Les exportations de 2025 sont concentrées autour de quelques opérateurs majeurs : **SMB (71,52 Mt)**, **CHALCO (22,12 Mt)**, **CBG (17,37 Mt)** et **AGB2A SDM (17,01 Mt)**. Les cibles commerciales seront priorisées selon la maturité de leur infrastructure, la distance de roulage, leur politique de sous-traitance, leur qualité de paiement et leur disposition à signer des contrats pluriannuels.

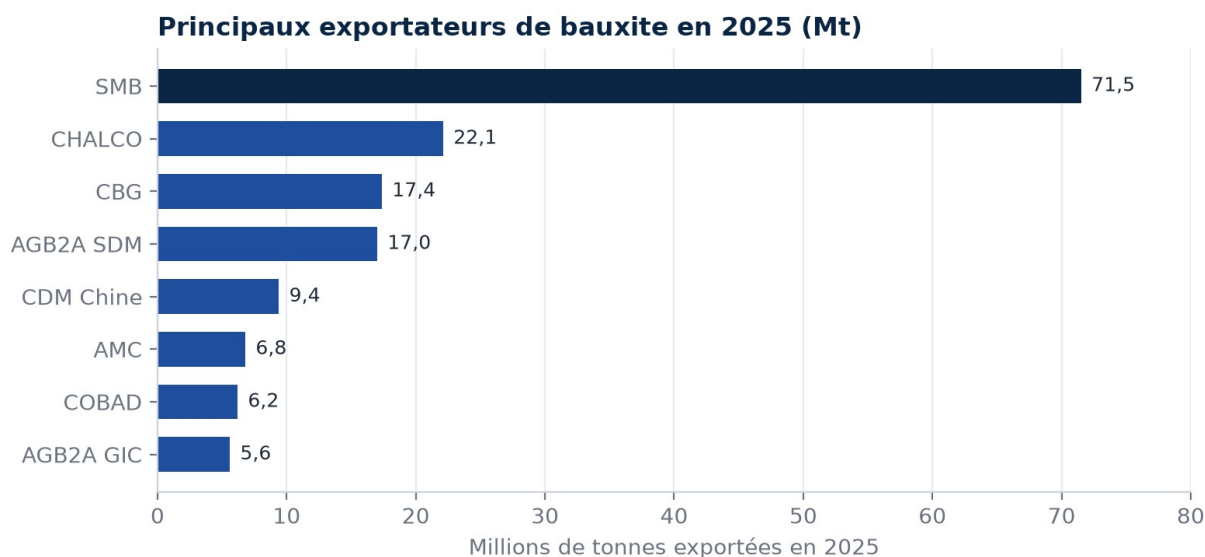


Figure 2 — Principaux exportateurs de bauxite en 2025
Source : MMG / ITIE-Guinée, Bulletin n°30, tableau 2.

3.3 Saisonnalité et contraintes physiques

La baisse des volumes pendant l'hivernage (juin à octobre) confirme l'importance du drainage, de la maintenance préventive, du stock de pneumatiques et d'une réserve de flotte. Le modèle ne suppose pas une production uniforme : la première année est volontairement limitée et **dix camions sont maintenus en réserve technique**.

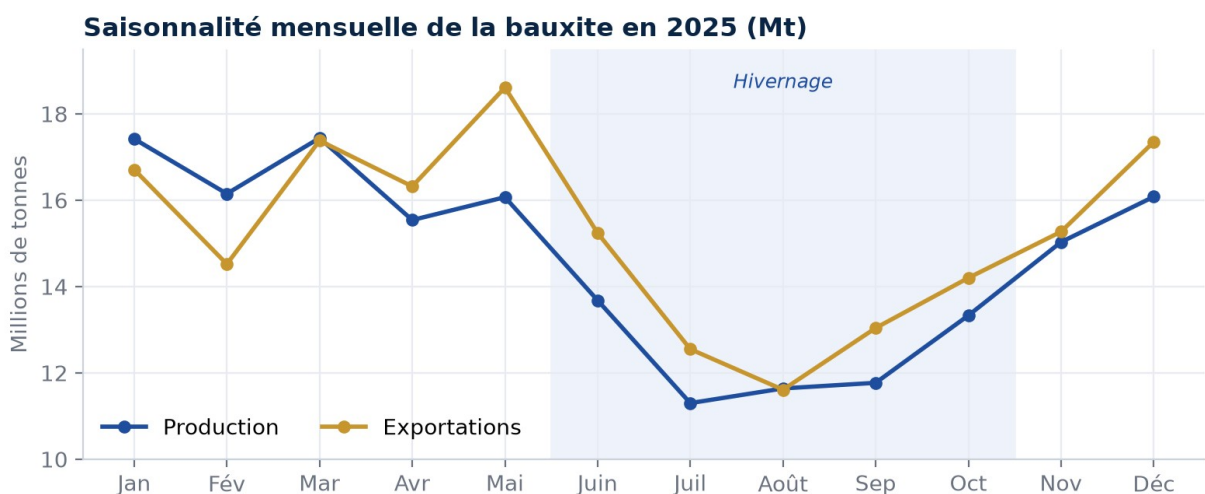


Figure 3 — Profil mensuel de la production et des exportations de bauxite en 2025
Source : MMG / ITIE-Guinée, Bulletin n°30.

3.4 Taille de marché adressable

Indicateur	Valeur	Lecture pour le projet
Exportations nationales de bauxite 2025	182,83 Mt	Base de marché publique
Capacité du projet en régime stabilisé	3,90 Mt/an	Environ 2,1 % du volume exporté en 2025
Volume du contrat en année 2	3,55 Mt	Environ 1,9 % du volume exporté en 2025
Portefeuille clients recommandé	1 contrat principal + 1 secondaire	Réduction du risque de concentration

3.5 Opportunités et points de vigilance

Opportunités	Points de vigilance
Croissance récente de la production et des exportations	Marché concentré autour de quelques opérateurs
Besoins de sous-traitance locale et exigences de contenu local	Forte pression concurrentielle sur les tarifs
Développement de raffineries et d'infrastructures	Risque de substitution par convoyeur ou rail
Besoin de professionnalisation HSE et numérique	Exposition au diesel, au change, aux pneus et aux pièces importées

04 STRATÉGIE COMMERCIALE ET CONTRACTUELLE

4.1 Approche de commercialisation

La stratégie consiste à **sécuriser d'abord un contrat principal adossé à un volume, puis à mobiliser la flotte**, et non l'inverse. Les étapes comprennent la préqualification, l'étude du corridor, la remise d'une offre technique, la négociation d'un modèle tarifaire transparent et la validation des garanties de paiement.

4.2 Architecture contractuelle minimale

Clause	Exigence recommandée	Justification
Durée	7 ans ferme (5 ans minimum)	Adossement à la durée de la dette
Volume garanti	≥ 3,38 Mt/an en régime	Maintien d'un DSCR ≥ 1,30x
Take-or-pay	85 % du volume mensuel programmé	Protection contre l'indisponibilité imputable au client
Tarif initial	≥ 6,55 USD/t pour 35 km aller simple	Seuil bancaire du cas de base
Carburant	Indexation mensuelle ou fourniture par le client	Neutralisation du principal coût variable
Paieement	30 jours, facturation bimensuelle, compte séquestre	Protection du fonds de roulement
Route	Entretien et disponibilité à la charge du client	Préservation de la productivité et des pneus
Temps d'attente	Franchise définie puis facturation	Protection contre les files de chargement
Résiliation anticipée	Indemnité couvrant l'encours de dette et la démobilisation	Protection des prêteurs et des actionnaires
Cession de créances	Acceptation par le client de la cession au profit des prêteurs	Condition standard de bancabilité
Pesage	Pont-basculé certifié et rapprochement quotidien	Sécurisation du chiffre d'affaires

4.3 Formule tarifaire proposée

$$T_n = T_0 \times [40 \% + 40 \% \times (\text{Diesel}_n / \text{Diesel}_0) + 20 \% \times (\text{FX}_n / \text{FX}_0)]$$

La formule répartit le tarif entre une composante fixe, une composante carburant et une composante de change. Elle sera recalibrée sur la structure réelle des coûts (le carburant représente environ un tiers des coûts d'exploitation en année 2) et sur les conditions de fourniture du diesel.

4.4 Pipeline commercial

Segment cible	Proposition	Priorité
Grand producteur bauxitique	Contrat principal de 70 à 80 camions	Très élevée
Deuxième opérateur ou projet de raffinerie	Contrat complémentaire de 20 à 30 camions	Élevée

Segment cible	Proposition	Priorité
Entreprises de travaux miniers	Mouvements de stériles et de matériaux	Moyenne
Projets d'infrastructure	Latérite, agrégats, terrassement	Opportuniste

05 PLAN TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL

5.1 Hypothèses de dimensionnement

Paramètre	Hypothèse centrale	Statut
Flotte totale	100 camions-bennes lourds	Dimensionnement du projet
Flotte programmée	90 camions/jour	Hypothèse
Réserve technique	10 camions	Hypothèse
Charge utile contractuelle	45 tonnes	À valider (audit de route et constructeur)
Distance aller simple	35 km	Corridor de référence, à remplacer par le trajet réel
Rotations moyennes	3 par jour	À confirmer par chronométrage
Jours productifs	321 jours/an	Inclut arrêts et saisonnalité
Consommation	1,05 litre par tonne transportée	Hypothèse de modélisation
Disponibilité mécanique	≥ 85 %	KPI contractuel

5.2 Calcul de capacité

$$90 \text{ camions} \times 45 \text{ t} \times 3 \text{ rotations} \times 321 \text{ jours} = 3\,900\,000 \text{ tonnes/an}$$

Cette capacité est un maximum contractuel stabilisé et non une garantie indépendante des conditions de chargement, de la route et du port. La productivité sera mesurée par cycle complet, et non uniquement par la disponibilité des camions.

5.3 Composition de la flotte

Équipement	Quantité	Fonction
Camions-bennes lourds	100	Transport principal
Camions-ateliers mobiles	4	Dépannage et maintenance de proximité
Citernes carburant	2	Distribution contrôlée du diesel
Dépanneuse lourde	1	Récupération des véhicules immobilisés
Véhicules HSE et supervision	8	Contrôle opérationnel et interventions
Minibus du personnel	2	Relève et transport des équipes
Ambulance	1	Réponse médicale d'urgence

5.4 Processus opérationnel

Étape	Contrôle essentiel
1	Planification de la production et affectation des chauffeurs
2	Inspection avant départ et autorisation de mise en service
3	Chargement et contrôle de la charge utile
4	Transport sous surveillance GPS/IVMS

Étape	Contrôle essentiel
5	Pesage, déchargement et validation du tonnage
6	Retour, gestion de file et nouvelle rotation
7	Rapprochement journalier tonnage - carburant - kilométrage
8	Maintenance préventive selon kilométrage et heures moteur

5.5 Maintenance et pièces

L'atelier central couvrira la maintenance préventive, le diagnostic électronique, les pneumatiques, le graissage, le lavage, la soudure, les réparations de benne et la gestion des composants majeurs. Le stock initial sera établi par criticité et délai d'approvisionnement. Les moteurs, boîtes, ponts, suspensions, freins et pneus feront l'objet d'un programme de remplacement fondé sur l'état réel, financé par un **compte de réserve de maintenance**.

KPI technique	Cible
Disponibilité mécanique	$\geq 85 \%$
Respect de la maintenance planifiée	$\geq 95 \%$
Taux de panne en ligne	$\leq 3 \%$ des départs
Immobilisation moyenne	Suivie par type de panne
Exactitude du stock de pièces	$\geq 98 \%$
Écart carburant physique / système	$\leq 1 \%$

06 ORGANISATION, RESSOURCES HUMAINES ET CONTENU LOCAL

6.1 Structure de gouvernance

Niveau	Fonctions clés
Conseil d'administration	Stratégie, financement, audit, nomination de la direction ; comité d'audit et des risques
Direction générale	Contrat client, performance globale, conformité, relation prêteurs
Direction des opérations	Production, dispatch, chauffeurs, relation avec le site
Direction technique	Maintenance, pièces, pneus, carburant
Direction HSE-Q	Sécurité, qualité, environnement, social, enquêtes incidents
Direction administrative et financière	Comptabilité IFRS/SYSCOHADA, trésorerie, fiscalité, contrôle de gestion, reporting prêteurs
Ressources humaines	Recrutement, formation, paie, discipline, relations sociales

6.2 Effectif cible

Catégorie	Effectif indicatif
Chauffeurs titulaires, relèves et réserve	220
Mécaniciens, électriciens et soudeurs	30
Techniciens pneus, graissage et lavage	16
Dispatchers et contrôleurs de flotte	12
HSE, qualité et sécurité routière	15
Magasin, achats et carburant	10
Administration, finance et RH	18
Direction et responsables	8
Sécurité, nettoyage et soutien	15
Total indicatif	344

L'effectif sera recalculé après validation des cycles de travail, de la politique de relève et des services externalisés. Le budget salarial du modèle est un plafond agrégé, et non une grille de rémunération individuelle.

6.3 Contenu local

La loi L/2022/0010/CNT définit l'entreprise locale comme une entreprise établie et immatriculée en Guinée, dont le capital est détenu à au moins **51 %** par des personnes guinéennes, avec au moins **50 %** de personnel dirigeant et **75 %** de personnel d'exécution guinéens. Elle prévoit également l'approvisionnement local en biens et services et la transmission de plans d'approvisionnement.

Source : Conseil National de la Transition, loi L/2022/0010/CNT portant contenu local, articles 1 à 3 et article 8.

ORIENTATION DE STRUCTURATION

La SPV sera constituée en droit guinéen, avec un plan de nationalisation des postes, un programme de formation des chauffeurs et techniciens et une politique documentée d'achats locaux. Toute entrée d'un partenaire étranger sera plafonnée de façon à préserver la qualification d'entreprise locale.

6.4 Formation

Population	Formation minimale
Chauffeurs	Conduite défensive, route minière, fatigue, freinage, inspection, premiers secours
Mécaniciens	Procédures constructeur, consignation, levage, diagnostic et sécurité atelier
Dispatchers	Planification, système de flotte, gestion des incidents et reporting
Managers	Leadership HSE, gestion contractuelle, coûts, enquête et conformité

07 HSE, NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

7.1 Référentiel international applicable

Les institutions financières internationales conditionnent leur financement au respect de standards environnementaux et sociaux reconnus. Le projet est, selon toute vraisemblance, de **catégorie B** au sens des **Principes de l'Équateur** (impacts limités, largement réversibles et maîtrisables). Le système de management sera aligné sur :

Référentiel	Application au projet
Normes de performance IFC (PS1 à PS4)	Système de gestion E&S (ESMS), conditions de travail, prévention de la pollution, santé et sécurité des communautés
Principes de l'Équateur IV	Catégorisation, évaluation E&S, plan d'action E&S (ESAP), mécanisme de plainte, suivi indépendant
Directives EHS du Groupe Banque mondiale	Directives générales et directives transport routier / hydrocarbures
ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001	Certification visée dans les 24 mois suivant la mise en service
ISO 39001	Management de la sécurité routière, recommandé pour un opérateur de flotte lourde
Conventions fondamentales de l'OIT	Interdiction du travail forcé et du travail des enfants, liberté syndicale, non-discrimination

7.2 Principaux dangers et mesures critiques

Danger	Mesure critique
Collision ou renversement	Limiteurs, IVMS, contrôle de vitesse, conduite défensive, voies séparées
Fatigue	Rosters, contrôle des heures, pauses, détection de somnolence, aptitude médicale
Surcharge	Pont-bascule, refus de départ, contrôle de la benne
Défaillance de freinage	Inspection quotidienne, maintenance, tests et zones de secours
Incendie / carburant	Extincteurs, mise à la terre, permis, confinement et plan d'urgence
Poussière et visibilité	Arrosage, distance de sécurité, éclairage et limitation de vitesse
Interaction communautaire	Plan de circulation, signalisation, sensibilisation et mécanisme de plainte
Travaux en atelier	Consignation, levage certifié, EPI et permis de travail

7.3 Objectifs de performance HSE

0 accident mortel	100 % chauffeurs habilités	≥ 95 % inspections réalisées	≤ 1 % excès de vitesse critiques
-----------------------------	--------------------------------------	--	--

100 %
incidents enquêtés

≥ 98 %
port des EPI

≤ 3 %
pannes en ligne

24/7
capacité d'urgence

7.4 Reporting quotidien

Domaine	Indicateurs
Production	Tonnes, rotations, temps de cycle, attente, distance
Flotte	Disponibilité, utilisation, pannes, immobilisation
Carburant	Litres, L/t, écarts, ravitaillements
HSE	Incidents, presque-accidents, vitesse, fatigue
Qualité	Écarts de pesage, réclamations, conformité documentaire
Finance	CA journalier, coût variable, marge par camion et par trajet

08 CADRE JURIDIQUE, FISCAL ET INSTITUTIONNEL

8.1 Textes de référence

Domaine	Référence principale	Incidence pour le projet
Droit des sociétés et sûretés	Actes uniformes OHADA (sociétés commerciales, sûretés)	Forme de la SPV, nantissements, cession de créances
Secteur minier	Code minier 2011 amendé en 2013	Accès aux sites, contrats avec les titulaires, exigences du donneur d'ordre
Contenu local	Loi L/2022/0010/CNT	Actionnariat, emploi, achats locaux, reporting
Fiscalité	Code général des impôts 2021 et lois de finances	Impôt sur les sociétés, TVA, retenues, obligations déclaratives
Travail et sécurité sociale	Code du travail et textes CNSS	Contrats, temps de travail, paie, santé et sécurité
Transport et circulation	Textes nationaux et règles du site minier	Immatriculation, assurance, permis, charge et circulation
Environnement	Code de l'environnement et EIES du client	Déchets, hydrocarbures, poussière, bruit, urgences

8.2 Fiscalité retenue dans le modèle

L'article 229 du Code général des impôts 2021 fixe l'impôt sur les sociétés à **25 %** pour les personnes morales autres que celles des secteurs expressément soumis à 30 % ou 35 %. Une société de transport indépendante, non titulaire d'un titre minier, est donc modélisée à 25 %, sous réserve de confirmation écrite du traitement fiscal, des éventuels agréments (Code des investissements) et des lois de finances ultérieures. Les droits et taxes à l'importation des camions sont réputés inclus dans le prix « rendu Guinée » et doivent être confirmés par un avis douanier.

Source : Direction Générale des Impôts, Code général des impôts 2021, article 229.

8.3 Taux de change

Le modèle est établi en USD afin d'aligner les investissements importés, la dette et les contrats miniers. À titre de conversion, le fixing BCRG du 31 juillet 2026 est de **8 762,7692 GNF pour 1 USD**. La société tiendra une comptabilité conforme aux obligations guinéennes et gèrera le risque de conversion des flux payés en GNF (salaires, achats locaux).

Source : Banque Centrale de la République de Guinée, fixing du 31 juillet 2026.

8.4 Autorisations et conformité préalables

Action	Responsable	Avant mobilisation
Constitution, RCCM, NIF, comptes bancaires	Promoteurs / conseil juridique	Oui
Agrément ou enregistrement contenu local	Direction / conseil	À confirmer
Contrats de travail et affiliation CNSS	RH	Oui

Action	Responsable	Avant mobilisation
Immatriculation et assurance de la flotte	Logistique / assureur	Oui
Permis de conduire et habilitations site	RH / HSE	Oui
Permis environnementaux du dépôt et de l'atelier	HSE / autorités	Oui
Conformité fiscale et douanière des importations	DAF / transitaire	Oui
Accord d'accès au site et plan de circulation	Client minier	Oui

09 COÛT DU PROJET ET PLAN DE FINANCEMENT

9.1 Budget d'investissement

Poste	M USD	Part
100 camions-bennes rendus en Guinée	16,50	55,0 %
Véhicules et équipements de soutien	2,00	6,7 %
Atelier, dépôt, magasin et aire de lavage	2,20	7,3 %
Stock initial de pièces stratégiques, pneus et lubrifiants	2,00	6,7 %
GPS, IVMS, logiciels et informatique	0,50	1,7 %
Mobilisation, formation, assurance et homologation	1,00	3,3 %
Sous-total investissements physiques	24,20	80,7 %
Provision pour aléas et imprévus (11,6 % des investissements)	2,80	9,3 %
Fonds de roulement et trésorerie de démarrage	3,00	10,0 %
Enveloppe d'investissement	30,00	100,0 %

Le prix moyen implicite d'un camion rendu en Guinée est de **165 000 USD**. Ce montant sera remplacé par des offres fermes incluant benne, options minières, transport, assurance, droits et mise en service, issues d'une mise en concurrence d'au moins trois constructeurs.

9.2 Tableau des emplois et ressources

Conformément aux pratiques des prêteurs, le coût total à financer intègre, au-delà de l'enveloppe d'investissement, les **frais de financement**, les **intérêts intercalaires** de la période de mobilisation (capitalisés selon IAS 23) et la **dotation initiale du compte de réserve du service de la dette (DSRA)**.

Emplois	M USD	Ressources	M USD
Investissements physiques	24,20	Fonds propres (capital et avances d'actionnaires)	11,41
Provision pour aléas	2,80	Dette senior à terme	21,18
Fonds de roulement initial	3,00		
Frais de montage et conseils des prêteurs	0,72		
Intérêts intercalaires (année 0)	0,67		
Dotation initiale DSRA	1,20		
Total des emplois	32,59	Total des ressources	32,59

9.3 Structure de financement

Source	M USD	Part	Conditions modélisées
Fonds propres	11,41	35 %	Apport intégral avant le premier tirage de la dette

Source	M USD	Part	Conditions modélisées
Dettes senior / crédit-bail	21,18	65 %	10,5 %, 7 ans dont 12 mois de mobilisation, remboursement sculpté
Total	32,59	100 %	

Sources de financement ciblées. Banques commerciales de la place (financement local en USD), institutions de financement du développement actives dans le secteur minier ouest-africain (IFC, Afreximbank, Banque africaine de développement, Proparco, etc.), financements adossés à une agence de crédit à l'exportation du pays du constructeur, crédit-bail fournisseur, et couverture du risque politique (ATI, MIGA) pour améliorer la notation du risque.

9.4 Sûretés et garanties

Instrument	Objet
Nantissement de la flotte et des équipements	Garantie sur les actifs financés
Cession des créances du contrat minier	Paiement direct sur un compte séquestre au profit des prêteurs
Nantissement des comptes et des titres de la SPV	Contrôle des flux et possibilité de substitution (step-in)
Compte de réserve du service de la dette (DSRA)	6 mois de service de la dette
Compte de réserve de maintenance (MRA)	Financement des révisions majeures
Assurances tous risques et perte d'exploitation	Délégation au profit des prêteurs
Engagement de volume du client (take-or-pay)	Sécurisation du chiffre d'affaires
Garantie des actionnaires pendant la mobilisation	Couverture du risque de dépassement de coûts et de retard

9.5 Cascade des paiements (waterfall)

Toutes les recettes du contrat sont encaissées sur un compte de recettes nanti. Elles sont affectées selon l'ordre de priorité suivant, standard en financement de projet :

Rang	Affectation
1	Charges d'exploitation, impôts et taxes
2	Frais, commissions et intérêts de la dette senior
3	Remboursement du principal de la dette senior
4	Reconstitution du DSRA à son niveau cible
5	Dotation au compte de réserve de maintenance
6	Distributions aux actionnaires, si DSCR $\geq 1,20x$, réserves pleines et absence de défaut

9.6 Engagements financiers (covenants)

Ratio	Seuil de distribution	Cas de défaut	Cas de base
DSCR historique (12 mois glissants)	$\geq 1,20x$	$< 1,10x$	1,60x min.
LLCR	$\geq 1,40x$	$< 1,20x$	1,60x min.
Dettes / (dettes + fonds propres)	—	$> 70 \%$	68 % max. (A1)
DSRA	Niveau cible atteint	Non reconstitué sous 60 jours	6 mois

10 HYPOTHÈSES ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

10.1 Hypothèses économiques centrales

Hypothèse	Valeur
Calendrier	Année 0 : mobilisation de 12 mois ; années 1 à 7 : exploitation
Tarif initial	7,10 USD/t, indexé de 2 % par an
Volumes	2,75 Mt (A1, montée en cadence), 3,55 Mt (A2), 3,85 Mt (A3), 3,90 Mt/an ensuite
Prix du diesel de référence	1,37 USD/litre (12 000 GNF au fixing retenu), + 1,5 % par an
Consommation	1,05 litre par tonne
Autres coûts variables	1,46 USD/t (maintenance 0,82 ; pneus 0,43 ; lubrifiants et divers 0,21), + 3 % par an
Coûts fixes (personnel, assurances, structure)	4,80 M USD en A1, + 3 % par an
CAPEX de maintien	0,3 à 1,2 M USD par an (révisions majeures), soit 5,6 M USD sur 7 ans
Besoin en fonds de roulement	12 % du chiffre d'affaires (≈ 44 jours), récupéré en fin d'horizon
Amortissements	Linéaire sur 7 ans jusqu'à une valeur résiduelle de 5,0 M USD (IAS 16)
Impôt sur les sociétés	25 %, avec report des déficits
Coût des fonds propres (actualisation)	18 % ; coût moyen pondéré du capital ≈ 11,4 %

10.2 Compte de résultat prévisionnel

M USD	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
Volume (Mt)	2,75	3,55	3,85	3,90	3,90	3,90	3,90
Tarif (USD/t)	7,10	7,24	7,39	7,53	7,69	7,84	8,00
Chiffre d'affaires	19,52	25,71	28,44	29,38	29,97	30,57	31,18
Carburant	-3,96	-5,18	-5,71	-5,87	-5,95	-6,04	-6,13
Autres coûts variables	-4,01	-5,34	-5,96	-6,22	-6,41	-6,60	-6,80
Coûts fixes	-4,80	-4,94	-5,09	-5,25	-5,40	-5,56	-5,73
EBITDA	6,75	10,24	11,68	12,05	12,21	12,36	12,52
Marge EBITDA	35 %	40 %	41 %	41 %	41 %	40 %	40 %
Amortissements	-3,38	-3,47	-3,63	-3,83	-4,16	-4,66	-5,86
Résultat d'exploitation (EBIT)	3,37	6,78	8,05	8,22	8,05	7,70	6,66
Charges financières	-2,22	-2,21	-1,92	-1,53	-1,07	-0,57	0,00
Impôt sur les sociétés	-0,29	-1,14	-1,53	-1,67	-1,74	-1,78	-1,66
Résultat net	0,86	3,43	4,60	5,02	5,23	5,35	4,99

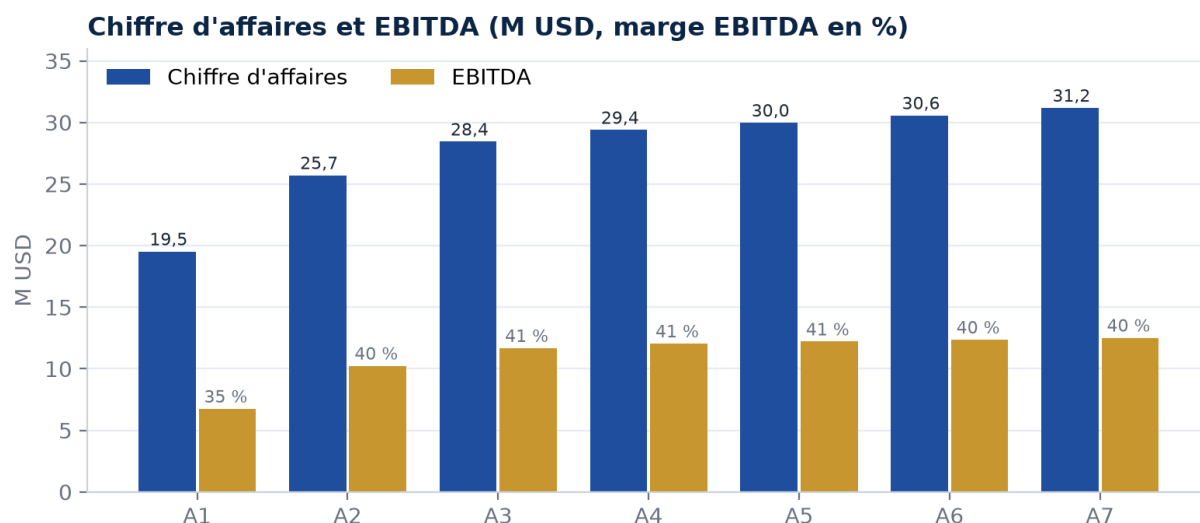


Figure 4 — Chiffre d'affaires et EBITDA prévisionnels

10.3 Structure des coûts

Structure des coûts d'exploitation — Année 2

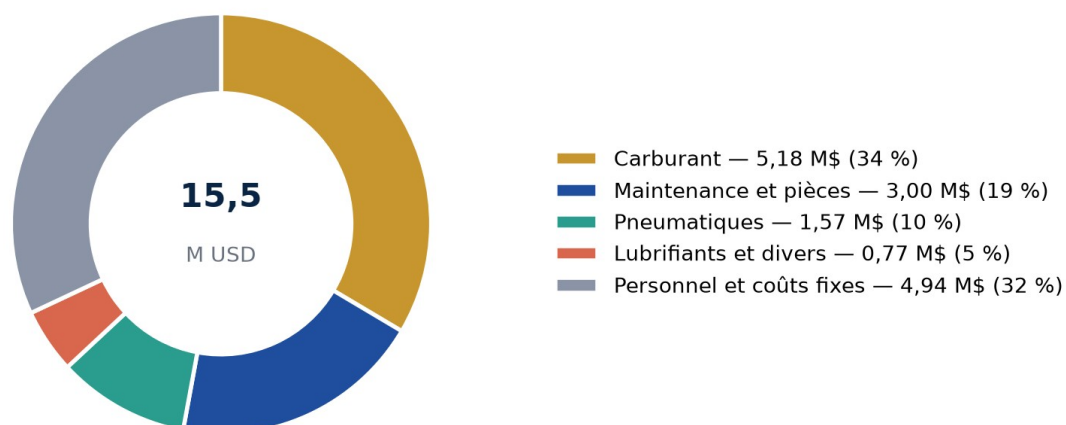


Figure 5 — Répartition des coûts d'exploitation de l'année 2

10.4 Tableau des flux de trésorerie et service de la dette

M USD	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
EBITDA	6,75	10,24	11,68	12,05	12,21	12,36	12,52
Impôt payé	-0,29	-1,14	-1,53	-1,67	-1,74	-1,78	-1,66
CAPEX de maintien	-0,30	-0,50	-0,80	-0,80	-1,00	-1,00	-1,20
Variation du BFR	-2,34	-0,74	-0,33	-0,11	-0,07	-0,07	3,67
Cession des actifs (valeur résiduelle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Flux disponible pour le service de la dette (CFADS)	3,82	7,86	9,02	9,46	9,39	9,51	18,32
Intérêts	-2,22	-2,21	-1,92	-1,53	-1,07	-0,57	0,00

M USD	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
Principal	-0,17	-2,71	-3,72	-4,39	-4,81	-5,38	0,00
DSCR	1,60x	1,60x	1,60x	1,60x	1,60x	1,60x	-
Mouvement du DSRA	-1,26	-0,36	-0,14	0,02	-0,04	2,97	0,00
Flux disponibles pour les actionnaires	2,17	2,58	3,24	3,57	3,48	6,53	19,32

Le fonds de roulement initial (3,0 M USD) finance la constitution du BFR en année 1. Une trésorerie minimale de 1,0 M USD est conservée en permanence ; le solde est distribué sous réserve des tests de distribution. La dernière année intègre la cession de la flotte à sa valeur résiduelle et la récupération du BFR.

10.5 Profil de la dette et couverture

M USD	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Encours début	21,18	21,01	18,30	14,58	10,19	5,38
Intérêts	2,22	2,21	1,92	1,53	1,07	0,57
Principal	0,17	2,71	3,72	4,39	4,81	5,38
Encours fin	21,01	18,30	14,58	10,19	5,38	0,00
DSCR	1,60x	1,60x	1,60x	1,60x	1,60x	1,60x
LLCR	1,60x	1,60x	1,60x	1,60x	1,60x	1,60x

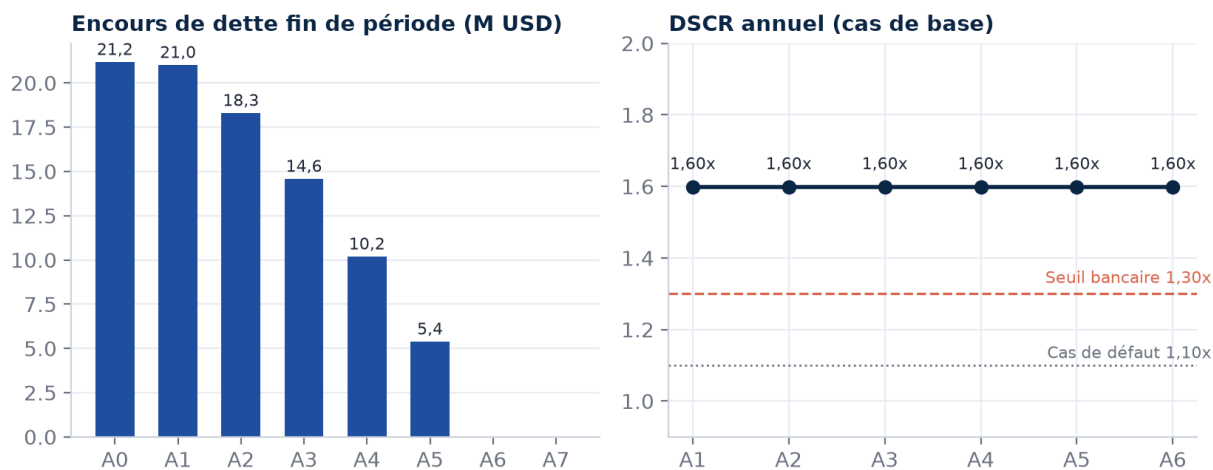


Figure 6 — Encours de dette et ratio de couverture du service de la dette

10.6 Bilan prévisionnel simplifié

M USD	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Immobilisations nettes	28,39	25,31	22,34	19,51	16,48	13,32	9,66
Besoin en fonds de roulement	0,00	2,34	3,09	3,41	3,53	3,60	3,67
Compte DSRA	1,20	2,46	2,82	2,96	2,94	2,97	0,00
Trésorerie	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

M USD	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Total actif	32,59	31,11	29,25	26,88	23,95	20,89	14,33
Fonds propres (y c. avances d'actionnaires)	11,41	10,10	10,94	12,30	13,76	15,51	14,33
Dette senior	21,18	21,01	18,30	14,58	10,19	5,38	0,00
Total passif	32,59	31,11	29,25	26,88	23,95	20,89	14,33

10.7 Rentabilité et ratios clés

29,7 % TRI fonds propres	19,9 % TRI projet après impôt	6,10 M\$ VAN fonds propres à 18 %	4,0 ans retour après mise en service
------------------------------------	---	---	--

Ratio	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Dette nette / EBITDA	2,60x	1,41x	0,91x	0,52x	0,12x	−0,08x
Couverture des intérêts (EBITDA / intérêts)	3,04x	4,64x	6,08x	7,87x	11,41x	21,87x
Dette / (dette + fonds propres)	68 %	63 %	54 %	43 %	26 %	0 %
Rentabilité des fonds propres (ROE)	9 %	31 %	37 %	36 %	34 %	37 %
Marge nette	4 %	13 %	16 %	17 %	17 %	18 %

LECTURE FINANCIÈRE

Le rendement du cas de base (TRI fonds propres de 29,7 %, TRI projet de 19,9 % contre un coût moyen pondéré du capital d'environ 11 %) est attractif, mais il dépend fortement du contrat. Le scénario ne doit pas être présenté comme une promesse de performance : il sert à fixer les seuils de négociation, les protections bancaires et les variables à auditer. Sans valeur résiduelle en fin d'horizon, le TRI fonds propres reste de 28,8 %.

11 ANALYSE DE SENSIBILITÉ ET TESTS DE RÉSISTANCE

11.1 Résultats des scénarios

Chaque scénario est calculé à **profil de dette constant** (celui du cas de base), conformément à la pratique des prêteurs : seul l'impact du choc sur la capacité de remboursement est mesuré.

Scénario	TRI FP	VAN M\$	DSCR min.	EBITDA A2
Cas de base	29,7 %	6,10	1,60x	10,24
Tarif –10 %	15,1 %	–1,48	1,21x	7,67
Volume –15 %	17,0 %	–0,54	1,26x	7,97
Diesel +20 %	23,8 %	3,05	1,44x	9,21
CAPEX +10 %	25,3 %	4,08	1,49x	10,24
Coûts fixes +15 %	25,4 %	3,89	1,49x	9,50
Retard de démarrage 6 mois	22,6 %	2,71	1,59x	10,24
Taux d'intérêt +200 pb	27,4 %	5,06	1,49x	10,24
Cas bas prêteur (combiné modéré)	8,4 %	–5,33	1,06x	6,87
Stress combiné sévère	–6,5 %	–9,96	0,72x	4,90
Cas bas avec protections contractuelles*	11,7 %	–3,54	1,16x	–

*Cas bas prêteur : tarif –5 %, volume –10 %, diesel +15 %, CAPEX +5 %. Stress sévère : tarif –10 %, volume –15 %, diesel +20 %, CAPEX +10 %. * Cas bas avec indexation carburant effective (diesel neutralisé).*

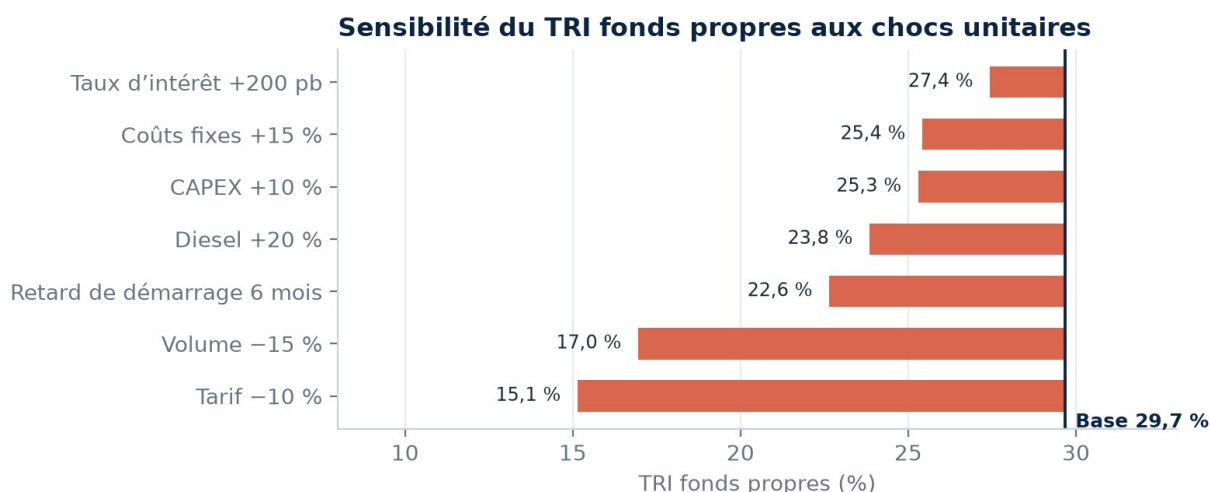


Figure 7 — Sensibilité du TRI fonds propres aux chocs unitaires

11.2 Points morts et seuils critiques

Seuil	Valeur	Interprétation
Point mort d'exploitation (A2)	1,16 Mt/an	Volume couvrant les coûts d'exploitation, avant dette et impôt

Seuil	Valeur	Interprétation
Volume pour DSCR 1,30x	87 % du plan (3,38 Mt en régime)	Minimum de sécurité bancaire au tarif central
Volume pour DSCR 1,00x	73 % du plan (2,86 Mt en régime)	Seuil de défaut de paiement hors réserves
Tarif pour DSCR 1,30x	6,55 USD/t (A1)	Tarif plancher de négociation au volume central
Tarif pour DSCR 1,00x	5,99 USD/t (A1)	Seuil de défaut de paiement hors réserves
Diesel pour DSCR 1,30x	1,91 USD/l	Hausse tolérable de 39 % sans indexation

ENSEIGNEMENT POUR LA NÉGOCIATION

Le projet est **plus sensible au tarif et au volume qu'au coût d'investissement**. Une baisse de 10 % du tarif ou de 15 % du volume ramène le DSCR sous 1,30x ; le stress combiné sévère ne permet pas de servir la dette (DSCR 0,72x). Le take-or-pay, l'indexation carburant et le compte séquestre ne sont donc pas des options : ce sont des **conditions de bancabilité**.

11.3 Priorité des leviers

Rang	Levier	Action
1	Tarif et indexation	Refuser un tarif non indexé ou inférieur au plancher bancaire
2	Volume garanti	Introduire un take-or-pay et un calendrier mensuel
3	Productivité réelle	Chronométrer le cycle avant tout engagement
4	Prix d'acquisition	Mettre en concurrence au moins trois constructeurs
5	Disponibilité mécanique	Garantie, pièces, techniciens constructeur et stock critique
6	Délai de paiement	Compte séquestre ou garantie bancaire de paiement

12 ANALYSE DU RISQUE DE CRÉDIT

La grille ci-dessous reprend l'analyse des « 5 C » utilisée par les comités de crédit. Elle identifie les points forts du dossier et les conditions à remplir pour obtenir une décision favorable.

Critère	Appréciation	Mesures d'atténuation
Capacité de remboursement	DSCR de base 1,60x, LLCR 1,60x ; sensibilité forte au tarif et au volume	Take-or-pay, indexation, DSRA 6 mois, remboursement sculpté
Caractère du sponsor	Promoteur local diversifié ; expérience en transport minier à démontrer	Management expérimenté, assistance technique constructeur, partenaire technique, KYC complet
Capital	35 % de fonds propres, apportés avant la dette	Garantie de dépassement de coûts pendant la mobilisation
Collatéral	Flotte et équipements ≈ 18,5 M USD à neuf ; valeur de réalisation forcée estimée à 60-70 %, soit une couverture inférieure à l'encours initial	La sûreté principale est la cession de créances du contrat minier ; assurances déléguées
Conditions de marché	Marché bauxitique en croissance mais concentré ; risque pays Guinée	Contrat en USD, clients de premier rang, assurance risque politique (ATI, MIGA)

POINT DE VIGILANCE DES PRÊTEURS

Au démarrage, la valeur de revente de la flotte ne couvre pas à elle seule l'encours de la dette. Le crédit repose donc sur la **qualité du contrat et du client minier** (financement adossé aux flux). La solidité financière du donneur d'ordre, sa notation et son historique de paiement seront au cœur de la due diligence.

13 GOUVERNANCE, CONFORMITÉ ET REPORTING

13.1 Gouvernance d'entreprise

- Conseil d'administration comprenant au moins un administrateur indépendant ; comité d'audit et des risques.
- Séparation des fonctions d'engagement, de paiement et de contrôle ; double signature au-delà de seuils définis.
- Politique d'achats avec mise en concurrence documentée et registre des conflits d'intérêts.

13.2 Conformité et intégrité

Domaine	Exigence
Connaissance du client (KYC)	Identification des actionnaires et bénéficiaires effectifs, vérification des personnes politiquement exposées
Lutte contre le blanchiment (LBC/FT)	Procédures alignées sur les recommandations du GAFI et la réglementation BCRG
Anti-corruption	Code de conduite, politique cadeaux et paiements de facilitation, clauses anti-corruption dans tous les contrats ; conformité aux conventions OCDE et ONU
Sanctions internationales	Filtrage des contreparties et fournisseurs (listes ONU, UE, OFAC)
Transparence	Déclaration des paiements au secteur extractif conforme aux exigences ITIE

13.3 Reporting aux prêteurs et investisseurs

Document	Fréquence	Délai
Rapport opérationnel (tonnages, disponibilité, HSE)	Mensuel	15 jours
Comptes de gestion et suivi budgétaire	Trimestriel	45 jours
Certificat de conformité aux ratios	Semestriel	60 jours
États financiers audités (IFRS et SYSCOHADA)	Annuel	120 jours
Rapport de suivi environnemental et social	Annuel	90 jours
Modèle financier mis à jour et budget	Annuel	Avant le début de l'exercice

Les comptes seront audités par un cabinet d'audit de réputation internationale. Un ingénieur indépendant des prêteurs pourra être mandaté pour valider les hypothèses techniques et suivre la mobilisation.

14 PLAN DE MISE EN ŒUVRE

14.1 Phasage

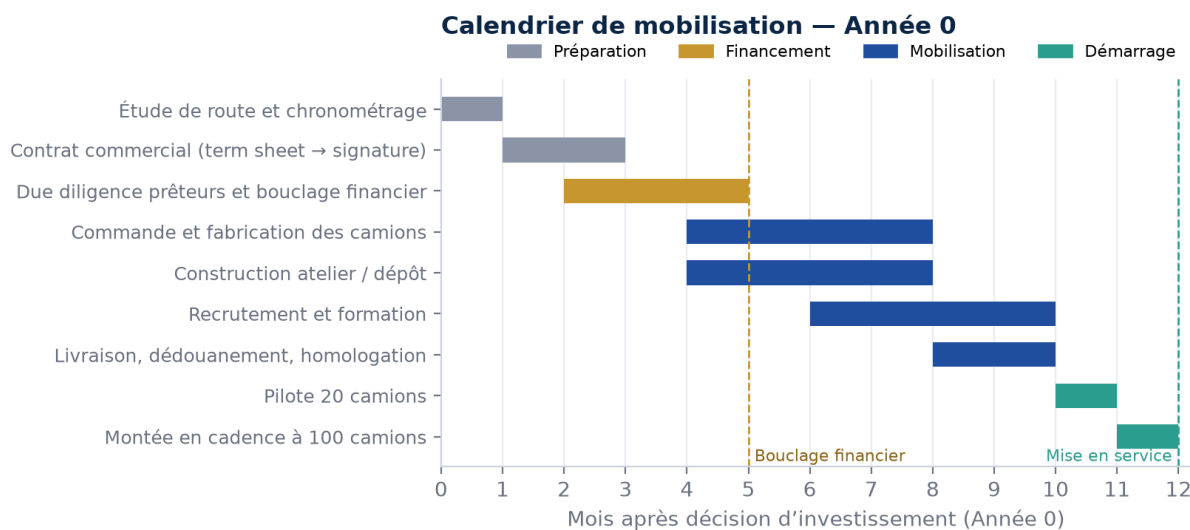


Figure 8 — Calendrier indicatif de mobilisation sur 12 mois (année 0)

14.2 Jalons de décision

Jalon	Livrable	Décision
J1 — Préfaisabilité	Étude de corridor, besoin client, modèle économique	Poursuivre ou arrêter
J2 — Offre commerciale	Tarif, SLA, volume, projet de contrat	Entrer en négociation finale
J3 — Due diligence	Juridique, fiscale, technique, E&S, contrepartie	Approuver l'investissement
J4 — Bouclage financier	Documentation de crédit signée, conditions préalables levées	Commande ferme
J5 — Réception usine	Inspection des véhicules	Autoriser l'expédition
J6 — Pilote 20 camions	Productivité et sécurité validées	Monter à 100 camions
J7 — Réception définitive	Performance sur 90 jours	Clôturer la mobilisation

14.3 Plan des 100 premiers jours d'exploitation

Période	Priorités
Jours 1-30	Stabiliser inspections, carburant, dispatch, pesage, maintenance et reporting
Jours 31-60	Réduire les temps d'attente, analyser les pannes récurrentes, ajuster stocks et roster
Jours 61-100	Valider les coûts unitaires, la performance contractuelle, le bonus/malus et le plan d'amélioration

15 RISQUES STRATÉGIQUES ET MESURES DE MAÎTRISE

Risque	Impact	Probabilité	Mesure principale
Absence de contrat ferme	Très élevé	Élevée	Ne pas commander avant contrat et garanties
Volume insuffisant	Élevé	Moyenne	Take-or-pay et diversification client
Hausse du diesel	Très élevé	Élevée	Indexation ou fourniture par le client
Dégradation de la route	Très élevé	Élevée	SLA route, audit et pénalités
Retard de paiement	Très élevé	Moyenne	Séquestre, garantie bancaire, facturation fréquente
Pannes et pièces	Élevé	Moyenne	Garantie constructeur, stock critique, atelier, MRA
Accident grave	Critique	Moyenne	Système HSE, fatigue, vitesse, formation
Risque de change	Élevé	Moyenne	Tarif en USD ou indexation FX
Retard de mobilisation	Élevé	Moyenne	Garantie de dépassement des sponsors, pénalités constructeur
Douane / importation	Moyen	Moyenne	Transitaire expérimenté et provision
Conflit communautaire	Élevé	Moyenne	Engagement, recrutement local, gestion des plaintes
Substitution par rail ou convoyeur	Élevé	Faible à moyenne	Durée ferme et diversification des services
Résiliation anticipée	Critique	Faible à moyenne	Indemnité, reprise de dette et valeur résiduelle
Risque pays et réglementaire	Élevé	Moyenne	Assurance risque politique, clauses de stabilisation

PRINCIPE DE MAÎTRISE

Tout risque non transférable au client doit être tarifé, assuré, couvert par une réserve ou absorbé par des fonds propres suffisants. Un risque ignoré ne disparaît pas : il se transforme en besoin de trésorerie.

16 CONCLUSION ET RECOMMANDATION D'INVESTISSEMENT

Le marché guinéen de la bauxite est suffisamment profond pour soutenir un opérateur de 100 camions. La croissance récente des volumes, la concentration des activités dans les corridors côtiers et les exigences de contenu local créent une opportunité réelle pour un prestataire local professionnel.

Le projet est **recommandé sous conditions**. Le coût total de 32,6 M USD ne doit être engagé qu'après validation simultanée du contrat, du corridor, des devis fournisseurs, de la fiscalité, du financement et du système HSE. Le cas de base produit un TRI fonds propres de 29,7 % et un DSCR minimum de 1,60x, mais le stress combiné sévère détruit de la valeur et ne couvre pas la dette.

Décision	Condition
GO conditionnel	Contrat $\geq$ 5 ans (idéalement 7), volume garanti $\geq$ 3,38 Mt/an, tarif $\geq$ 6,55 USD/t, indexation diesel, paiement sécurisé, fonds propres apportés
NO-GO	Commande sans contrat, route non auditée, absence de garantie de paiement, dette sans différé
Option prudente	Démarrage avec 20 à 30 camions et option ferme d'extension après validation du pilote

RECOMMANDATION FINALE

Négocier et financer le projet comme un **contrat d'infrastructure logistique**, et non comme un simple achat de véhicules. La valeur réside dans le droit contractuel de transporter un volume rentable pendant une durée suffisante, sécurisé par des flux cédés aux prêteurs.

17 SOURCES DOCUMENTAIRES

Réf.	Institution	Document et lien
S1	Ministère des Mines et de la Géologie / ITIE-Guinée	Bulletin des Statistiques Minières et Carrières n°30, janvier-décembre 2025, publié le 11 avril 2026. itie-guinee.org
S2	Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives	Fiche pays Guinée : contribution du secteur extractif à l'économie. eiti.org/countries/guinea
S3	ITIE internationale	Guinea achieves a good score in EITI implementation, 15 mai 2026. eiti.org/news
S4	Conseil National de la Transition	Loi L/2022/0010/CNT portant contenu local en République de Guinée. cnt.gov.gn
S5	Ministère des Mines et de la Géologie / CPDM	Code minier 2011 amendé en 2013. cpdm.mines.gov.gn
S6	Direction Générale des Impôts	Code général des impôts 2021, notamment article 229. dgi.gov.gn
S7	Banque Centrale de la République de Guinée	Fixing du 31 juillet 2026 : USD/GNF 8 762,7692. bcrg-guinee.org
S8	Equator Principles Association / IFC	Principes de l'Équateur IV (2020) ; Normes de performance environnementale et sociale de l'IFC (2012)

TRAÇABILITÉ

Les chiffres officiels repris dans le document renvoient à ces sources. Les hypothèses de projet sont identifiées comme telles et seront remplacées par les données issues du contrat et de la due diligence.

ANNEXE A — MATRICE COMPLÈTE DES HYPOTHÈSES

Famille	Hypothèse	Statut
Marché	Bauxite, corridor Boké-Boffa	Choix stratégique
Flotte	100 camions (90 programmés)	Projet
Charge utile	45 t	À confirmer
Distance aller	35 km	À remplacer par la route réelle
Rotations/jour	3	À chronométrer
Jours productifs	321	Hypothèse
Tarif initial	7,10 USD/t	À négocier
Indexation	2 %/an + formule diesel/FX	À contractualiser
Diesel	1,37 USD/l, + 1,5 %/an	Référence budgétaire
Consommation	1,05 l/t	À mesurer
Autres coûts variables	1,46 USD/t, + 3 %/an	À valider par devis
Coûts fixes	4,80 M USD, + 3 %/an	Budget
Enveloppe d'investissement	30,0 M USD	Budget
Coût total du projet	32,6 M USD	Calculé
Dette	21,2 M USD, 10,5 %, 7 ans	Hypothèse
Profil de remboursement	Sculpté, DSCR cible 1,60x	Hypothèse
DSRA	6 mois de service	Standard prêteurs
BFR	12 % du CA	Hypothèse
IS	25 %	Référence fiscale à confirmer
Valeur résiduelle	5,0 M USD en A7	Hypothèse prudente

ANNEXE B — PLAN DE DUE DILIGENCE AVANT FINANCEMENT

Volet	Vérifications minimales
Commercial	Contrat, volumes, historique de paiement, solidité financière et notation du client
Technique	Profil de route, pentes, revêtement, cycle, ponts, aires de retournement (ingénieur indépendant)
Flotte	Devis, garantie, pièces, homologation, consommation, charge utile
Financier	Audit du modèle financier par un tiers, fiscalité, change, BFR, assurances, dette
Juridique	Société, permis, sûretés, résiliation, force majeure, litiges
Environnemental et social	ESIA ou audit E&S, ESMS, ESAP, mécanisme de plainte, dépôt carburant
Ressources humaines	Disponibilité des chauffeurs, salaires, roster, formation
Intégrité	KYC/UBO, filtrage sanctions, vérification de réputation des sponsors et contreparties

ANNEXE C — ÉTATS FINANCIERS PRÉVISIONNELS DÉTAILLÉS

M USD	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
Chiffre d'affaires	19,525	25,709	28,439	29,385	29,973	30,572	31,183
Coûts variables	7,971	10,522	11,669	12,088	12,363	12,645	12,933
Coûts fixes	4,800	4,944	5,092	5,245	5,402	5,565	5,731
EBITDA	6,754	10,243	11,678	12,051	12,207	12,363	12,519
Amortissements	3,384	3,468	3,628	3,828	4,161	4,661	5,861
Intérêts	2,224	2,206	1,922	1,531	1,070	0,565	0,000
Impôt	0,286	1,142	1,532	1,673	1,744	1,784	1,664
Résultat net	0,859	3,427	4,596	5,019	5,232	5,352	4,993
CFADS	3,825	7,859	9,018	9,465	9,393	9,507	18,323
Principal	0,169	2,711	3,721	4,391	4,807	5,383	0,000
Flux actionnaires	2,170	2,579	3,236	3,565	3,480	6,533	19,323
Encours de dette fin	21,013	18,302	14,581	10,190	5,383	0,000	0,000

Flux des actionnaires : apport de 11,406 M USD en année 0, puis flux ci-dessus. TRI fonds propres 29,7 % ; TRI projet après impôt 19,9 % ; VAN des fonds propres à 18 % : 6,10 M USD.

ANNEXE D — CAHIER DES CHARGES MINIMAL DES CAMIONS

Élément	Exigence
Configuration	Camion-benne adapté au corridor et à la charge utile contractuelle
Motorisation	Puissance et refroidissement adaptés à la pente, à la poussière et à la chaleur
Freinage	Frein moteur / ralentisseur, ABS selon configuration, avertisseurs
Benne	Volume compatible avec la densité de la bauxite, protection anti-usure, bâchage si requis
Sécurité	ROPS/FOPS si exigé, caméras, alarme de recul, extincteurs, coupe-batterie
Télématique	GPS, IVMS, lecture CAN, carburant, vitesse, géorepérage
Maintenance	Garantie, formation, outillage, documentation et stock initial
Confort	Climatisation, siège suspendu, réduction de la fatigue et visibilité

ANNEXE E — NOTE DE RÉVISION : HARMONISATION DES VERSIONS 1 ET 2

La présente version consolide les deux versions antérieures du business plan et révisé le modèle financier pour le rendre conforme aux attentes des prêteurs internationaux. Les principales modifications sont les suivantes :

Point	Versions 1 et 2	Version 3.0 consolidée
Présentation des nombres	Mélange de points et virgules décimales (v1)	Format français homogène (virgule décimale)
Part de marché	« environ 2,2 % » et « 2,13 % » selon les pages	2,1 % partout (3,90 / 182,83 Mt)
Calendrier	Exploitation dès l'année 1, alors que la mobilisation dure 12 mois	Année 0 de mobilisation ajoutée, cohérente avec le planning
Coût total	30,0 M USD (investissements seuls)	32,6 M USD avec frais, intérêts intercalaires et DSRA
Financement	Dette 19,5 M USD / fonds propres 10,5 M USD	Dette 21,2 M USD / fonds propres 11,4 M USD (65/35 maintenu)
Remboursement	Linéaire sur 5 ans après 12 mois de grâce	Sculpté sur DSCR constant, 7 ans au total
BFR et amortissements	BFR fixe ; valeur résiduelle et BFR agrégés (8,0 M USD)	BFR à 12 % du CA ; amortissement jusqu'à VR 5,0 M USD (IAS 16)
Hypothèses implicites	Escalade des coûts variables non documentée	Diesel + 1,5 %/an et autres variables + 3 %/an explicités
Normes et gouvernance	Non traitées	Term sheet, covenants, waterfall, IFC PS, Principes de l'Équateur, KYC/LBC, reporting
Résultats clés	TRI 37,3 % ; VAN 8,45 M\$; DSCR min. 1,44x	TRI 29,7 % ; VAN 6,10 M\$; DSCR min. 1,60x
Seuils de négociation	Tarif $\geq$ 6,93 USD/t ; volume $\geq$ 3,30 Mt	Tarif $\geq$ 6,55 USD/t ; volume $\geq$ 3,38 Mt en régime

La baisse du TRI par rapport aux versions précédentes résulte principalement de l'intégration de la période de mobilisation (les fonds propres sont investis un an avant les premiers revenus) et des coûts de financement. Elle rend le dossier **plus crédible** auprès d'un comité de crédit, qui aurait de toute façon retraité ces éléments.

ANNEXE F — GLOSSAIRE FINANCIER

Terme	Définition
CFADS	Cash Flow Available for Debt Service : flux de trésorerie disponible pour le service de la dette (EBITDA – impôts – CAPEX de maintien – variation du BFR)
DSCR	Debt Service Coverage Ratio : CFADS de la période / service de la dette (intérêts + principal) de la période
LLCR	Loan Life Coverage Ratio : valeur actualisée des CFADS sur la durée restante du prêt / encours de la dette
DSRA	Debt Service Reserve Account : compte de réserve nanti couvrant 6 mois de service de la dette
MRA	Maintenance Reserve Account : compte de réserve pour les révisions majeures de la flotte
IDC	Interest During Construction : intérêts intercalaires de la période de mobilisation, capitalisés
Take-or-pay	Engagement du client de payer un volume minimum, qu'il soit transporté ou non
TRI / VAN	Taux de rendement interne / valeur actuelle nette des flux de trésorerie
Remboursement sculpté	Échéancier dont le principal est ajusté aux flux prévus pour maintenir un DSCR constant
Waterfall	Cascade contractuelle d'affectation des recettes du projet
Step-in	Droit des prêteurs de se substituer à l'emprunteur défaillant dans l'exécution du contrat
